

# **INFORME SEMANAL**

## **FONDO COLOMBIA EN PAZ**

**02 al 06 de julio de 2018**



# Ejecución Presupuestal



## Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
  - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
  - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
  - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
  - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.





## Balance Fondo Colombia en Paz

% Recursos contratados/desembolsos



### Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
DESEMBOLSOS	\$ 1.159.070	\$ 1.150.270	\$ 1.500	\$ 7.300
CONTRATADO	\$ 763.456*	\$ 754.656*	\$ 1.500	\$ 7.300
PAGADO	\$ 527.809	\$ 526.309	\$ 1.500	\$ -

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

El gráfico presentan la relación de contratados y desembolsados.

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.

(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol convenio de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos.

\*El valor disminuye con respecto a la semana anterior debido al incremento de contratos terminados, cuyos saldos no ejecutados se disminuyen de los compromisos y pasan a la etapa de planeación.



## Recursos de PGN administrados por el FCP

70%

Subcuentas	Asignados	Contratados	Pagados	En proceso de planeación y estructuración
Sustitución de Cultivos	\$ 680.699	\$ 433.518	\$ 337.071	\$ 247.182
ART- Programas de Desarrollo con Enfoque territorial	\$ 200.754	\$ 152.502	\$ 51.592	\$ 48.252
Reincorporación	\$ 121.907	\$ 91.933	\$ 91.933	\$ 29.973
JEP	\$ 44.493	\$ 23.761	\$ 17.828	\$ 20.732
Proyectos Productivos - ADR	\$ 28.880	\$ 19.021	\$ 7.824	\$ 9.859
Primera Infancia	\$ 20.000	\$ 5.311	\$ 2.940	\$ 14.689
Agencia Nacional de Tierras	\$ 18.281	\$ 1.219	\$ 843	\$ 17.061
Funcionamiento	\$ 17.859	\$ 12.167	\$ 5.819	\$ 5.692
Presidencia Posconflicto	\$ 7.688	\$ 7.505	\$ 4.190	\$ 184
Sociedad de Activos Especiales	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 0
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.720	\$ 1.271	\$ 30
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$ 0	\$ 0	\$ 1.959
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.150.270</b>	<b>\$ 754.656 *</b>	<b>\$ 526.309</b>	<b>\$ 395.614</b>

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Relación entre los recursos pagados y los contratados.

\*El valor disminuye con respecto a la semana anterior debido al incremento de contratos terminados, cuyos saldos no ejecutados se disminuyen de los compromisos y pasan a la etapa de planeación



## Resultados recursos administrados por FCP

---

**Aprobado el CONPES 3932** que define los lineamientos de **articulación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final**.

**Finalizó fase de planeación en 108 veredas de Valledupar (Cesár)** con la participación de 3.150 personas. A la fecha se ha logrado cerrar esta fase en 135 de los 170 municipios.

Realizada **cualificación de 530 agentes** educativos y comunitarios en recreación **en primera infancia en La Guajira y Caquetá**.

**Entregadas 428 hectáreas a comunidades negras y 73 títulos de propiedad a campesinos en La Guajira**. Beneficiarán 451 familias.

Realizada **Feria Colombia Renace en Dabeiba (Antioquia)** con la participación de 4.048 personas y 35 entidades del orden nacional, departamental y municipal.

**Lanzada la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica** de exintegrantes de las FARC.




# Procesos de contratación





## Línea de tiempo – Procesos de Contratación

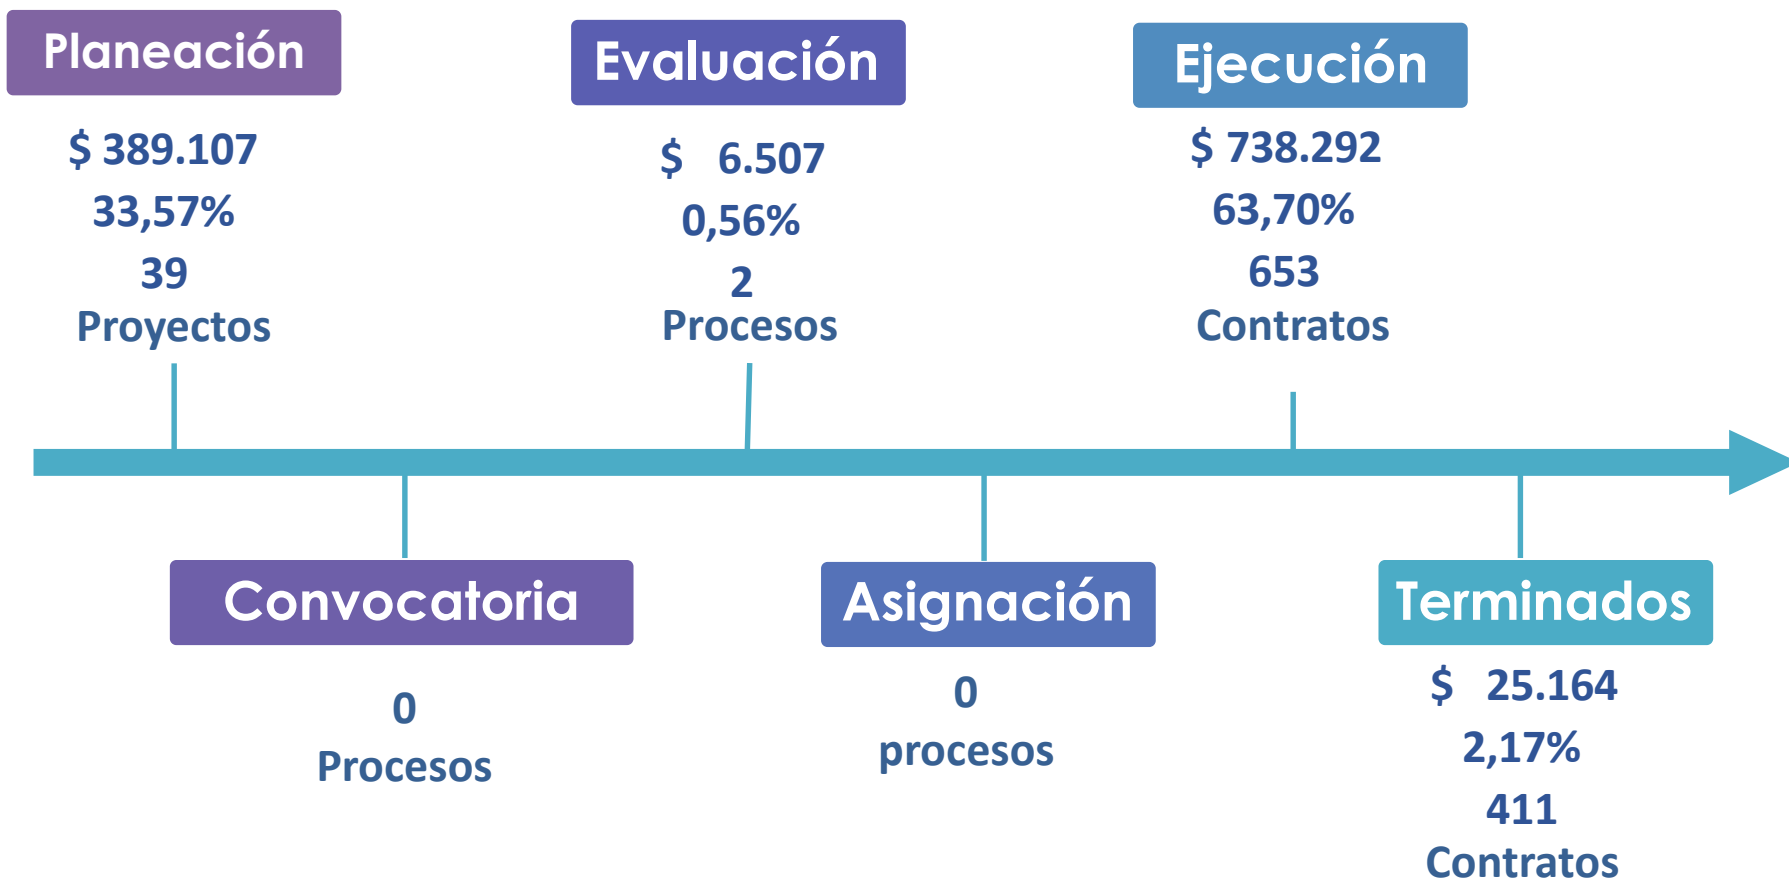

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

Incluye recursos PGN, aportes privados (\$1.500 millones de Fundapanaca) y otros recursos públicos (\$7.300 millones de Cenit)



Planeación

\$ 389.107

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Programa Sustitución de Cultivos Ilícitos	\$ 245.145	Dirección de Sustitución de Cultivos	jul-18
Operador Logístico Municipal	\$ 23.256	ART	jul-18
Beneficios económicos: proyectos productivos	\$ 19.320	ARN	jul-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 18.489	ART	jul-18
Sistemas de Información JEP	\$ 17.527	JEP	jul-18
Compra de tierras	\$ 12.000	ANT	Por definir
Proyectos Productivos	\$ 9.859	Agencia de Desarrollo Rural	jul-18
Renta Básica, asignaciones únicas de normalización, pensión y BEPS	\$ 10.653	ARN	jul-18
Pilotaje de modalidad familiar: educación Inicial en la zona rural y rural dispersa – Santa Rosa Sur, San pablo y Cantagallo, Bolívar	\$ 4.091	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 3.937	ANT	jul-18
Colecciones especializadas de literatura y salas de lectura para primera infancia	\$ 3.780	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
1000 primeros días de vida	\$ 2.866	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 2.640	JEP	jul-18
Auditoría externa	\$ 2.100	FCP	jul-18
Interventoría Café - Semilla	\$2.036	Dirección de Sustitución de Cultivos	jul-18





Planeación

\$ 389.107

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Seguridad Alimentaria	\$ 1.959	FAO/COOPERACIÓN	Por definir
Cuerpo sonoro: expresiones artísticas y primera infancia	\$ 1.129	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Viáticos y gastos de viaje	\$ 1.124	ANT	jul-18
Comisión Fiduciaria	\$ 1.123	FCP	jul-18
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	\$ 1.110	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Apoyo a la supervisión e interventoría de la experiencia de implementación del PMI PI	\$ 833	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 719	FCP	jul-18
Operación logística	\$ 500	JEP	Por definir
Transparencia	\$ 450	FCP	jul-18
Viáticos y gastos de viaje	\$ 412	FCP	jul-18
Programa de seguros	\$ 298	FCP	jul-18
Apoyo para la garantía registro civil de niños y niñas	\$ 295	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Portal web FCP	\$ 280	FCP	jul-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 255	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Análisis comparativo recursos CONPES primera infancia	\$ 210	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 184	DAPRE	jul-18



Planeación  
\$ 389.107

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Operación servicios TIC	\$ 177	FCP	jul-18
Documentación del PMI PI en territorios PDET	\$ 120	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Papelería	\$ 100	FCP	jul-18
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	JEP	Por definir
Por asignar Colombia Sostenible	\$ 30	DAPRE	Por definir
Adecuaciones menores	\$ 19	JEP	jul-18
Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 18	FCP	jul-18
Servicios de mantenimiento	\$ 15	FCP	jul-18
<b>Total</b>	<b>\$ 389.107</b>		

Nombre Corto	Valor	Observaciones
Crédito Colombia Sostenible	\$60.000	Crédito firmado. Reglamento operativo aprobado el 19 de junio.



Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 6.507

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría PIC II	<a href="#">ART</a>	\$ 5.210	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consorcio Interventorias para la Paz.</li> <li>2. Consorcio Cipa-INARCONST.</li> <li>3. GOC sucursal Colombia</li> </ol>	23 de julio de 2018
Estrategia y pauta	<a href="#">ART</a>	\$ 1.297	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rafael Poveda Televisión S.A.S.</li> <li>2. Brújula Comunicaciones</li> <li>3. UT Renovación 2018</li> <li>4. Big Media Publicidad S.A.S.</li> <li>5. Inversiones Inrai Ltda.</li> </ol>	18 de julio de 2018

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





# Ejecución de contratos



## Nota Técnica

- La relación porcentual presentada en los gráficos corresponde a la relación entre los recursos pagados y el valor total de los contratos en ejecución de forma agregada en cada una de las subcuentas.
- Este porcentaje puede bajar como consecuencia de la entrada de un nuevo contrato en ejecución, lo cual inmediatamente incrementa el valor total de los recursos contratados en la subcuenta, pero no así los giros correspondientes a pagos que obedece a la ejecución financiera del contrato.
- El valor total de los contratos en ejecución para cada una de las subcuentas disminuye tras la terminación de los contratos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$ 738.292

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	<a href="#">BAC 002</a>	\$235.784	Nov 2017 Nov 2018	88%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	<a href="#">AF 002</a>	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	56%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	<a href="#">AF 001</a>	\$60.000	Sep 2017 Oct 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	<a href="#">760-18</a>	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	10%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	<a href="#">771-18</a>	\$880	Ene 2018 Oct 2018	22%
Viáticos y gastos de viaje	N/A	N/A	\$31	N/A	61%
Prestación de Servicios Persona Natural	2	N/A	\$159	Ene 2018 Jul 2018	53%

\$433.488

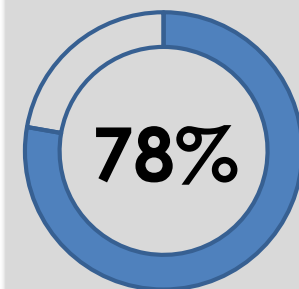

**EJECUCIÓN**

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$ 738.292

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	<a href="#">455-18</a>	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	<a href="#">454-18</a>	\$14.959		30%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	<a href="#">408-18</a>	\$14.772		30%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	<a href="#">534-18</a>	\$10.993		30%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	<a href="#">456-18</a>	\$7.319		30%
	Consorcio Caguan 2018	<a href="#">538-18</a>	\$9.295		30%
	Unión Temporal Renacer 2017	<a href="#">537-18</a>	\$5.641		30%
	Consorcio Chocó 2017	<a href="#">539-18</a>	\$5.588		30%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	<a href="#">409-18</a>	\$3.762		30%
	Corporación Prohaciendo	<a href="#">542-18</a>	\$1.868		30%
Consorcio Edificando Paz	<a href="#">535-18</a>	\$1.244	0%		
Operador Logístico PDET	Carvajal Tecnología y Servicios	<a href="#">124-17</a>	\$46.521	Nov 2017 Jul 2018	31%
Mejoramiento Vial	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	<a href="#">Convenio Marco 001-17</a>	\$5.991*	Jul 2018 Dic 2019	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	365 (2018)	N/A	\$9.781	Oct 2017 Ago 2018	65%
	75 (2017)	N/A	\$2.159	Dic 2017 Jul 2018	

\$156.360

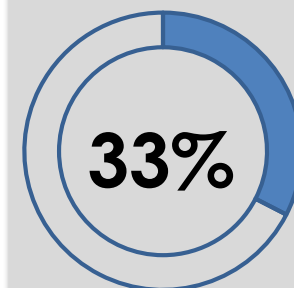

**EJECUCIÓN**

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones.  
\* Otros recursos Públicos.

PDET



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución


\$ 738.292

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la Política de la Primera Infancia “De cero a Siempre”	Save the Children	<a href="#">540-18</a>	\$3.285	Ene 2018 Jul 2018	60%
Implementación del proceso de cualificación “Mandalavida” en los municipios priorizados	Fundación Promoción y Gestión Social	<a href="#">782-18</a>	\$1.089	Mar 2018 Jul 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	6 (2017)	N/A	\$225	Oct 2017 Jul 2018	62%
	14 (2018)	N/A	\$551	Ene 2018 Jul 2018	

\$5.151

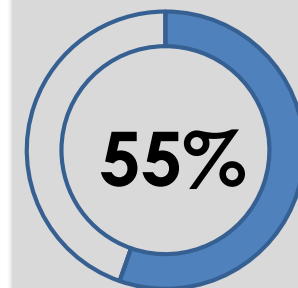

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$ 738.292

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Alquiler de Vehículos	Union Temporal Convencionales Blindados 2018	<a href="#">788-18</a>	\$1.372	Mar 2018 Ago 2018	36%
Adecuación y suministro del cableado estructurado	SICMES SAS	<a href="#">794-18</a>	\$ 614	Mayo 2018 Julio 2018	0%
Arquitectura de tecnologías de la información y analítica	Universidad de los Andes	<a href="#">402-18</a>	\$597	Ene 2018 Ago 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	Unión Temporal L&K	<a href="#">793-18</a>	\$575	May 2018 Nov 2018	15%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	<a href="#">791</a>	\$323	Abr 2018 Dic 2018	0%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	<a href="#">789-18</a>	\$100	Mar 2018 Jul 2018	0%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	<a href="#">796-18</a>	\$250	May 2018 May 2019	0%
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	Copy Solutions LTDA	<a href="#">795-18</a>	\$48	May 2018 Oct 2018	0%
Adecuaciones menores	N/A	N/A	\$ 6	Jun 2018 Ago 2018	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	106	N/A	\$6.370	Ene 2018 Sep 2018	59%

\$10.255



**EJECUCIÓN**

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*El porcentaje ejecutado disminuye debido a la incorporación de adiciones a contratos existentes de prestación de servicios.



**GOBIERNO DE COLOMBIA**





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 738.292

Terminados

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos relacionados con la reforma rural integral y sustitución voluntaria de cultivos en municipios priorizados y de interés para las partes	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	<a href="#">Convenio Marco 001-17</a>	\$1.309*	Dic 2017 Dic 2019	0%

\$1.309

0%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\* Otros recursos Públicos.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$ 738.292

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Oportunidades de negocios proyectos productivos	Propaís	<a href="#">403-18</a>	\$3.000	Ene 2018 Jul 2018	90%
Plan de medios acuerdo de paz	J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	<a href="#">558-18</a>	\$2.790	Dic 2017 Jul 2018	17%
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	<a href="#">616-2018</a>	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	1	N/A	\$53	Ene 2018 Jul 2018	66%

\$6.833



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 738.292

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda	<a href="#">786</a>	\$505	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consorcio Desarrollo rural 2018	<a href="#">784</a>	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consorcio Desarrollo rural 2018	<a href="#">787</a>	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	<a href="#">785</a>	\$497	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Andina)	Consorcio Escuela Galán - JPC	<a href="#">783</a>	\$490	May 2018 Nov 2018	45%
Prestación de Servicios Persona Natural	1	N/A	\$162	Ene 2018 Sep 2018	53%

\$2.659

47%

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 738.292

Terminados

Subcuenta	Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
<b>ARN</b>	Pagos de Renta Básica – Reincorporación pensión y BEPS	Banco Agrario	<a href="#">BAC 001</a>	\$87.438	Abr 2018 Dic 2018	100%
	Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	\$680	Jun 2018 Dic 2018	100%
<b>SAE</b>	Sociedad de Activos Especiales	SAE	<a href="#">059</a>	\$5.000	Dic 2020	100%
<b>ANT</b>	Prestación de Servicios Persona Natural - ANT	39	-	\$1.216	Ene 2018 Jun 2018	69%
	<b>TOTAL</b>			<b>\$94.335</b>		

Fuente: Fondo Colombia en Paz  
Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 738.292

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	<a href="#">001</a>	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	0%
Tecnologías de la información	Itelcom	<a href="#">765-18</a>	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	34%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	<a href="#">397-18</a>	\$778	Ene 2018 Dic 2018	48%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	<a href="#">781-18</a>	\$60	Mar 2018 Dic 2018	21%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$56	Ene 2018 Dic 2018	30%
Gastos varios	N/A	N/A	\$14	Ene 2018 Dic 2018	62%
Viáticos	N/A	N/A	\$14	Ene 2018 Dic 2018	100%
Equipo Unidad Técnica	12	N/A	\$2.735	Ene 2018 Dic 2018	60%

\$8.881

48%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 738.292

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	<a href="#">561-18</a>	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	<a href="#">123-17</a>	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	<a href="#">792-18</a>	\$463	Jun 2018 Ene 2019	0%

\$19.021

41%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 25.164

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor *	Terminación
JEP	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	<a href="#">572-17</a>	\$11.740	jun-18
Reincorporación	Fundapanaca	<a href="#">550</a>	\$ 5.000	mar-18
PDET	283 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 2.133	jun-18
JEP	59 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$1.609	jun-18
Funcionamiento	Fiducoldex	<a href="#">124-17</a>	\$1.536	mar-18
Funcionamiento	22 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 532	jun-18
Funcionamiento	Unión Temporal Itelcom - FP 2017	<a href="#">334</a>	\$ 400	dic-17
Presidencia Posconflicto	14 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 371	jun-18
Reincorporación	ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	<a href="#">617-2018</a>	\$ 315	jun-18
Presidencia Posconflicto	Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	<a href="#">532-18</a>	\$213	jun 2018
Funcionamiento	Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	<a href="#">4</a>	\$ 212	ene-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados	<a href="#">33-18</a>	\$163	may-18
Primera Infancia	9 Prestaciones de servicios Persona Natural	-	\$160	jun-18
JEP	Aon	NA	\$156	jun-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados S.A.	<a href="#">3</a>	\$ 117	dic-17

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones /\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 25.164

CONTRATOS TERMINADOS

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor *	Terminación
Funcionamiento	Syneris	<a href="#">541-18</a>	\$ 96	abr-18
Funcionamiento	Dattis Comunicaciones S.A.S.	<a href="#">533-18</a>	\$ 80	may-18
Presidencia Posconflicto	Dattis Comunicaciones S.A.S.	<a href="#">565</a>	\$ 71	dic-17
Colombia Sostenible	3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$61	jun-18
Funcionamiento	Armtrans Ltda.	<a href="#">121</a>	\$ 41	dic-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	<a href="#">122</a>	\$ 35	nov-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	<a href="#">335</a>	\$ 33	nov-17
Sustitución	1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 29	dic-17
Funcionamiento	Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	<a href="#">125</a>	\$ 21	dic-17
Presidencia Posconflicto	Salamarquez S.A.S.	<a href="#">559</a>	\$ 16	dic-17
Funcionamiento	Rumbos S.A.S.	<a href="#">790-18</a>	\$15	may-18
Funcionamiento	ABM Comercializadora S.A.S.	<a href="#">126</a>	\$ 6	dic-17
ANT	1 Prestación de Servicios Persona Natural	<a href="#">739</a>	\$3	feb-18

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones /\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.







# Fondos de Cooperación




## Nota Técnica

- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
  - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
  - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
  - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
  - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.




## Balance por Fondos de Cooperación


% Recursos contratados/desembolsos




Fondo  
Colombia  
Sostenible



Fondo  
Multidonante  
(ONU)



Fondo de la  
Unión  
Europea



Fondo del  
Banco  
Mundial

### COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 96,4

US \$7,1

### DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 82,7

EUR\$ 89,6

US \$7,1

### CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 68,4

EUR\$ 51,1

US \$5,8

### PAGADO

USD\$ 0

US\$ 58,1

EUR\$ 17,7

US \$2,5

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.





## Resultados Fondos de Cooperación

---

**461 m<sup>2</sup> despejados de sospecha de minas antipersonal en San Vicente del Caguán (Caquetá)**, beneficiando a más de 200 personas. Continúa despeje en demás municipios y entrenamiento de 23 excombatientes con Humanicemos DH.

**547 iniciativas formuladas** para los niños, niñas y adolescentes de en los municipios focalizados de **'Mi Futuro es Hoy'**, proyecto de prevención de reclutamiento infantil.

**Entregados 73 kits (filtro de agua + tanque de almacenamiento)** en zona de influencia de la ETCR en **Puerto Asís (Putumayo)**, beneficiando a 306 personas con recursos del Fondo Multidonante ONU.

**25 madres, padres y cuidadores** del resguardo indígena El Vigía en Arauquita (Arauca) fueron **capacitados en nutrición infantil** en el marco del proyecto **'Salud para la Paz'**.

**Lanzado proyecto de Enfoque de Género en la Policía** que se implementará en 7 municipios. Mejorará las medidas de protección frente a fenómenos de violencia de género para más de 200.000 personas y 1.602 excombatientes.





## Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fiduprevisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.
