



# INFORME SEMANAL FONDO COLOMBIA EN PAZ

05 al 09 de noviembre de 2018





# Glosario

**Asignación Presupuestal:** Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta y/o los traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

**Ejecución Presupuestal:** Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

**Disponibilidad Presupuestal:** Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestales.

**Ejecución Financiera:** Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

**Planeación:** Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea o componente del Plan Operativo Anual por subcuenta.



# Glosario

**Convocatoria:** Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html> y <http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx>

**Evaluación:** Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

**Asignación:** En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

**Ejecución:** Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo.

**Terminado:** Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



# Subcuentas Administradas

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  Reincorporación                                 |  Jurisdicción Especial de Paz    |  Presidencia Posconflicto       |
|  Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial |  Agencia Nacional de Tierras     |  Funcionamiento                 |
|  Primera infancia                                |  Colombia Sostenible BID         |  Procuraduría                   |
|  Sustitución de Cultivos                        |  Sociedad de Activos Especiales |  Contrapartidas de Cooperación |



# Resultados

**463 exintegrantes de las Farc-EP se beneficiarán con los siete proyectos aprobados** en sesión del Consejo Nacional de Reincorporación **por valor de \$5.217.047.403** y se trabajará en múltiples áreas económicas, desde las tradicionales de agricultura y ganadería, hasta comunicaciones.

**Aproximadamente 42 empresas del sector privado se han sumado a la red de aliados para apoyar los proyectos productivos** de emprendimiento de las personas culminadas de reintegración en los sectores de comercio, agricultura, avicultura, piscicultura y ganadería, entre otros.

**La comunidad de las veredas Golondrinas y Palo Verde en el municipio El Tambo (Cauca) celebran la entrega de dos puentes peatonales** que les mejoran su calidad de vida, ya que con estas obras se recortan trayectos y se generan condiciones de seguridad para los habitantes de la zona.

**Los representantes de 5 asociaciones de productores campesinos presentaron sus productos en la Feria Fruto de mi Tierra** que se realizó durante las fiestas del municipio de Dabeiba (Antioquia).



## Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 1.209.810	\$ 1.201.010	\$ 1.500	\$ 7.300
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 921.807	\$ 920.307	\$ 1.500	\$ -
TOTAL PAGADO	\$ 733.139	\$ 731.639	\$ 1.500	\$ -


Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

- (1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – Convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.  
(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol.






# Ejecución y Disponibilidad Presupuestal



Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 712.497	\$ 528.188	74%	\$ 184.310	26%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 208.055	\$ 178.722	86%	\$ 29.333	14%
Reincorporación	\$ 171.229	\$ 131.715	77%	\$ 39.514	23%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.493	\$ 26.826	60%	\$ 17.667	40%
Primera Infancia	\$ 20.000	\$ 19.114	96%	\$ 886	4%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 18.281	\$ 4.618	25%	\$ 13.662	75%
Funcionamiento	\$ 17.771	\$ 17.102	96%	\$ 669	4%
Presidencia Posconflicto	\$ 7.776	\$ 7.773	100%	\$ 4	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 5.000	\$ 5.000	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.750	100%	\$ 0	0%
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$ 0	0%	\$ 1.959	100%
Procuraduría	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.209.810</b>	<b>\$ 921.807</b>	<b>76%</b>	<b>\$ 288.004</b>	<b>24%</b>

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.



# Ejecución Financiera

Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 528.188	\$ 464.687	88%	\$ 63.501	12%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 178.722	\$ 82.527	46%	\$ 96.194	54%
Reincorporación	\$ 131.715	\$ 131.715	100%	\$ 0	0%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 26.826	\$ 23.254	87%	\$ 3.572	13%
Primera Infancia	\$ 19.114	\$ 4.939	26%	\$ 14.175	74%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 4.618	\$ 2.390	52%	\$ 2.229	48%
Funcionamiento	\$ 17.102	\$ 9.189	54%	\$ 7.913	46%
Presidencia Posconflicto	\$ 7.773	\$ 7.172	92%	\$ 601	8%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 5.000	\$ 5.000	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.268	82%	\$ 482	18%
Contrapartidas de Cooperación	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Procuraduría	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 921.807</b>	<b>\$ 733.139</b>	<b>80%</b>	<b>\$ 188.667</b>	<b>20%</b>


Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos pagados y recursos comprometidos.





# Línea del Tiempo

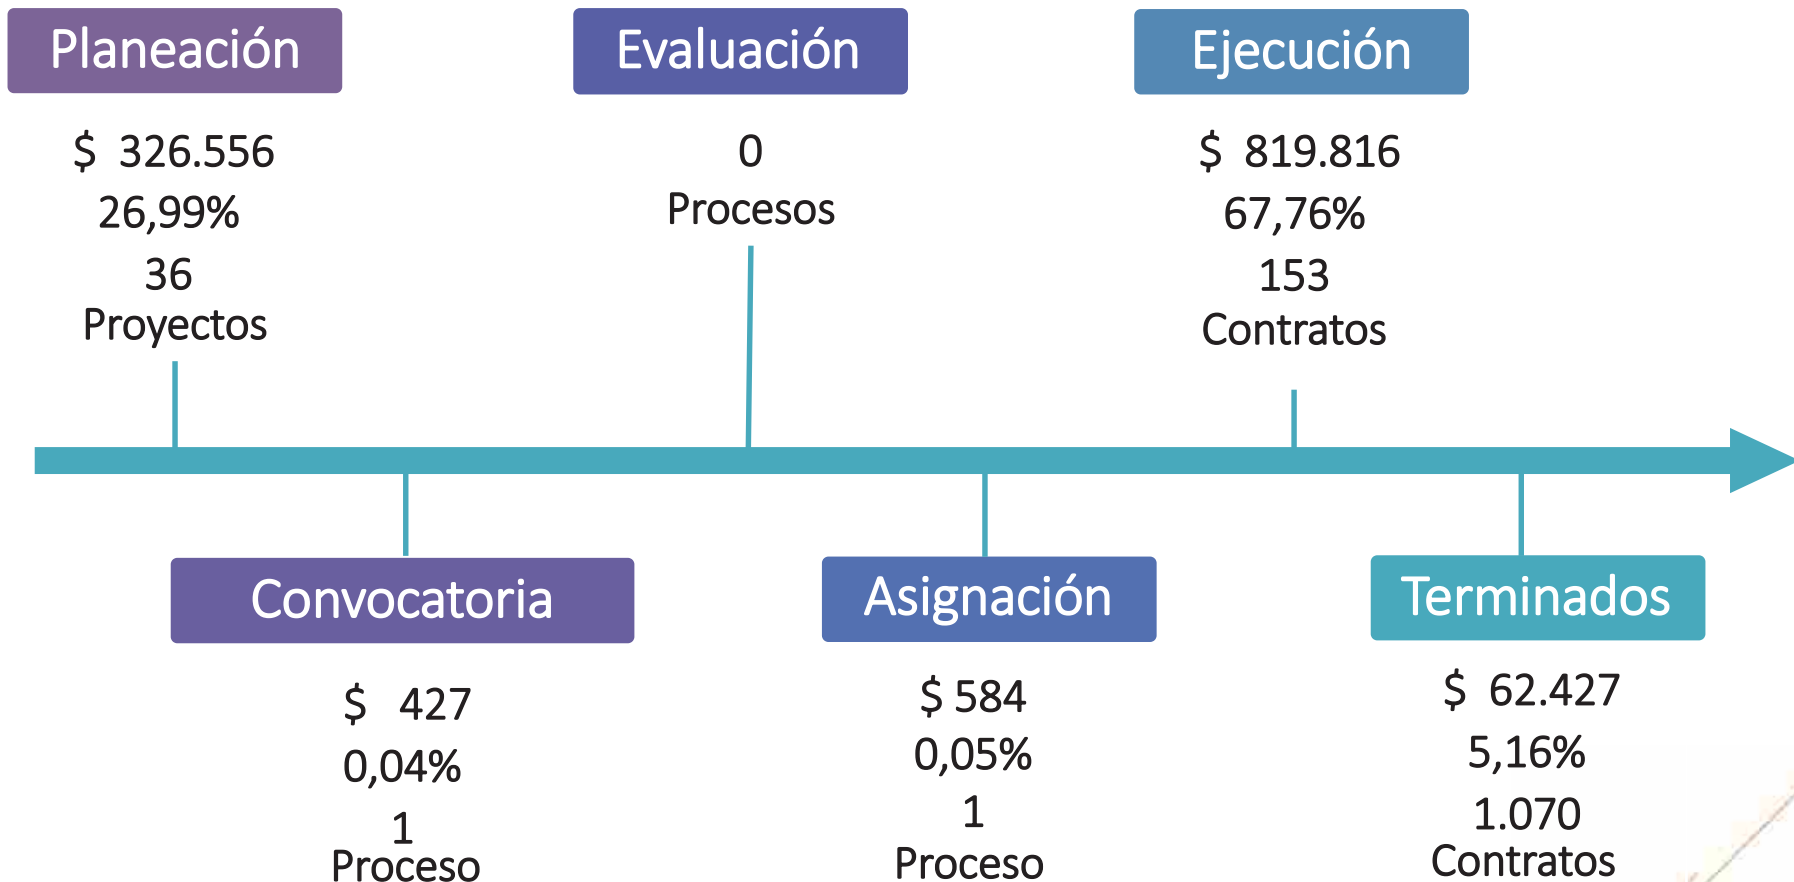



Planeación  
\$192.130

Convocatoria  
\$9

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$520.169

Terminado  
\$189

# Sustitución de Cultivos

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de Presidencia



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 192.130

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar	\$ 184.310	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
UNODC	\$ 7.500	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Interventoría Fedecacao	\$ 320	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS



Planeación

Convocatoria  
\$ 9

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	<a href="#">Dirección de Sustitución de Cultivos</a>	\$ 9	Proceso suspendido

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 520.169

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	<a href="#">BAC 002</a>	\$302.401	Nov 2017 Dic 2018	100%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	<a href="#">AF 002</a>	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	75%
Sustitución voluntaria y concentrada de cultivos	UNODC	<a href="#">AF 001</a>	\$60.000	Sep 2017 Oct 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	<a href="#">760-18</a>	\$14.280	Ene 2018 Ene 2020	10%
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	<a href="#">561-18</a>	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	<a href="#">123-17</a>	\$8.733	Nov 2017 Oct 2019	50%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao (Adición)	<a href="#">123-17</a>	\$1.058	Nov 2017 Oct 2019	0%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	<a href="#">771-18</a>	\$880	Ene 2018 Oct 2019	73%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	<a href="#">792-18</a>	\$463	Jun 2018 Feb 2019	31%
Prestación de Servicios Persona Natural	3 (2018)	N/A	\$150	Ago 2018 Dic 2018	50%
Viáticos y gastos de viaje	N/A	N/A	\$24	N/A	87%

\$520.169\*

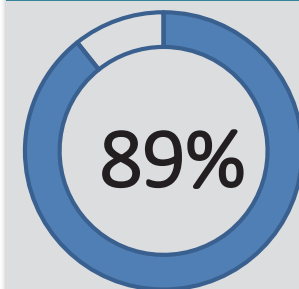

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 189

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$189	jul-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$43.745

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$148.536

Terminado  
\$15.773

# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

## (1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 43.745

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ART	\$ 29.333	ART	Por definir
Interventoría PIC II	\$ 8.799	ART	Por definir
Adición Contrato Carvajal	\$ 4.884	ART	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 728	ART	Por definir





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 148.536

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador Logístico	Carvajal Tecnología y Servicios	<a href="#">124-17</a>	\$51.448	Nov17 - Oct 18	80%
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	<a href="#">455-18</a>	\$16.467	Feb18 - Ene19	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	<a href="#">454-18</a>	\$14.959	Feb18 - Dic18	30%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	<a href="#">408-18</a>	\$14.772	Feb18 - Ene19	30%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	<a href="#">534-18</a>	\$11.442	Feb18 - Feb19	29%
	Consorcio Caguan 2018	<a href="#">538-18</a>	\$9.295	Feb18 - Dic18	30%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	<a href="#">456-18</a>	\$8.769	Feb18 - May19	25%
	Unión Temporal Renacer 2017	<a href="#">537-18</a>	\$5.641	Feb18 - Ene19	30%
	Consorcio Chocó 2017	<a href="#">539-18</a>	\$5.588	Feb18 - Feb19	30%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	<a href="#">409-18</a>	\$4.634	Feb18 - Feb19	24%
	Corporación Prohaciendo	<a href="#">542-18</a>	\$1.868	Feb18 - Ene19	30%
Consorcio Edificando Paz	<a href="#">535-18</a>	\$1.244	Feb18 - Dic18	0%	
Prestación de Servicios	54 OPS	N/A	\$1.289	Oct18 - Ene19	7%
Plan de Comunicaciones	Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$990	Ago18 - Dic18	0%
Viáticos	Viáticos	N/A	\$120	Nov18 – Dic18	0%
Gastos Varios	Gastos Varios	N/A	\$10	Nov17 - Dic18	100%

\$148.536

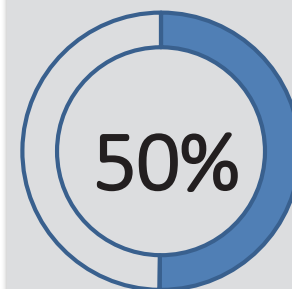

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 15.773

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
723 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$15.773	ago-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$39.514

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$125.665

Terminado  
\$6.050

# Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 39.514

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ARN	\$ 39.514	ARN	Por definir

REINCORPORACIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$125.665

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	<a href="#">BAC 001</a>	\$112.398	Abr 2018 Dic 2018	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$12.587	Abr 2018 Dic 2018	100%
Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	\$680	Jun 2018 Dic 2018	100%

\$125.665\*



EJECUCIÓN

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$6.050

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fundapanaca	<a href="#">550-17</a>	\$5.000	mar-18	En proceso de liquidación
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	<a href="#">617-18</a>	\$1.050	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$18.874

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$584

Ejecución  
\$2.228

Terminado  
\$22.807

# Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





Planeación  
\$ 18.874

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar JEP	\$ 17.667	JEP	Por definir
Operador Logístico	\$ 500	JEP	Por definir
Unión Temporal L & K	\$ 224	JEP	Por definir
Unipar	\$162	JEP	Por definir
Vlex	\$ 111	JEP	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 84	JEP	Por definir
Viáticos	\$ 80	JEP	Por definir
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	JEP	Por definir

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación  
\$ 584

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato*
Sistemas de información	<a href="#">JEP</a>	Password Consulting Services S.A.S.	\$ 584	09 de noviembre de 2018



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$2.228

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Arquitectura de tecnologías de la información y analítica	Universidad de los Andes	<a href="#">402-18</a>	\$597	Ene 2018 Nov 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	U.T. L&K	<a href="#">793-18</a>	\$575	May 2018 Nov 2018	80%
Prestación de Servicios Persona Natural	11	N/A	\$333	Ago 2018 Dic 2018	0%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	<a href="#">791-18</a>	\$323	Abr 2018 Dic 2018	78%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	<a href="#">796-18</a>	\$250	May 2018 May 2019	23%
ARL	N/A	N/A	\$73	Jun 2018 Dic 2018	96%
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	Copy Solutions LTDA	<a href="#">795-18</a>	\$72	May 2018 Dic 2018	54%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$6	Jun 2018 Dic 2018	100%

\$2.228

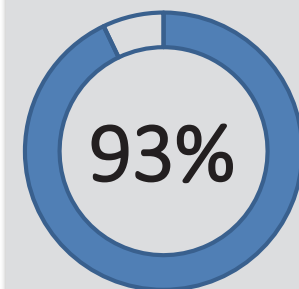

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 22.807

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	<a href="#">572-17</a>	\$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
170 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$7.829	sep-18	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	<a href="#">788-18</a>	\$1.372	ago-18	En proceso de liquidación
35 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$996	sep-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	<a href="#">794-18</a>	\$ 614	jul-18	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	NA	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	<a href="#">789-18</a>	\$100	sep-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$14.730

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$0,00

Terminado  
\$5.270

# Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Consejería Presidencial para la Primera Infancia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 14.730

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa. Santa Rosa, San Pablo y Catagallo - Bolívar	\$ 4.037	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	\$ 3.817	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Implementación oferta complementaria “Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida”, en municipios PDET	\$ 2.866	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación “Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia” en 28 municipios PDET	\$ 1.136	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	\$ 1.110	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 878	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Por asignar Primera Infancia	\$ 886	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 5.270

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	<a href="#">540-18</a>	\$3.285	jul-18	En proceso de liquidación
Fundación Promoción y Gestión Social	<a href="#">782-18</a>	\$1.089	ago-18	En proceso de liquidación
11 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$312	sep-18	En proceso de liquidación
18 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$583	oct-18	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$14.484

Convocatoria  
\$364

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$1.612

Terminado  
\$1.820

# Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 14.484

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ANT	\$ 13.662	ANT	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 821	ANT	Por definir





Planeación

Convocatoria  
\$ 364

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	<a href="#">ANT</a>	\$ 364	Proceso suspendido

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$1.612

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	48	-	\$1.064	Ene 2018 Dic 2018	58%
Gastos de Viajes	N/A	N/A	\$549	Jun 2018 Dic 2018	0%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$0,17	Nov 2017 Mar 2018	100%

\$1.612

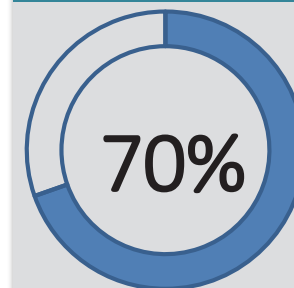

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 1.820

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
40 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$1.817	oct-18	En proceso de liquidación
1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$3	jul-18	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$1.117

Convocatoria  
\$53

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$13.117

Terminado  
\$3.484

# Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 1.117

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Funcionamiento	\$ 669	FCP	Por definir
Portal Web	\$ 150	FCP	Por definir
Desarrollo tecnológico	\$ 120	FCP	Por definir
Gestión Documental	\$ 117	FCP	Por definir
Papelería	\$ 30	FCP	Por definir
Adición Itelcom	\$ 25	FCP	Por definir
Suministro de Comunicaciones	\$ 6	FCP	Por definir

FUNCIONAMIENTO



Planeación

Convocatoria  
\$ 53

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	<a href="#">FCP</a>	\$ 53	Proceso suspendido

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 13.117

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Equipo Unidad Técnica	8	N/A	\$4.815	Ene 2018 Dic 2018	46%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	<a href="#">001</a>	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	46%
Auditoría	Ernst & Young	N/A	\$ 2.100	Jun 2018 Oct 2018	0%
Tecnologías de la información	Itelcom	<a href="#">765-18</a>	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	72%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	<a href="#">397-18</a>	\$778	Ene 2018 Dic 2018	91%
Viáticos	N/A	N/A	\$70	Ene 2018 Dic 2018	31%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	<a href="#">781-18</a>	\$60	Mar 2018 Ene 2019	51%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$30	Ene 2018 Dic 2018	100%
Gastos Reembolsables	N/A	N/A	\$18	Mar 2018 Dic 2018	0%
Gastos varios	N/A	N/A	\$17	Ene 2018 Dic 2018	51%
Pago de Nómina	PEC Servicios Especializados Ltda.	<a href="#">896-18</a>	\$7	Ago 2018 Dic 2018	43%

\$13.117

55%

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 3.484

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fiducoldex	<a href="#">124-17</a>	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
21 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 648	jun-18	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	<a href="#">334</a>	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	<a href="#">4</a>	\$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	<a href="#">33-18</a>	\$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	<a href="#">3</a>	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	<a href="#">541-18</a>	\$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	<a href="#">533-18</a>	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	<a href="#">122</a>	\$ 69	nov-17	En proceso de liquidación
1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 45	oct-18	Liquidado
Armtrans Ltda.	<a href="#">121</a>	\$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S.	<a href="#">335</a>	\$ 33	nov-17	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	<a href="#">125</a>	\$ 21	dic-17	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	<a href="#">790-18</a>	\$ 15	may-18	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	<a href="#">126</a>	\$ 6	dic-17	En proceso de liquidación

FUNCIONAMIENTO





Planeación  
\$4

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$991

Terminado  
\$6.782

# Presidencia Posconflicto

Transversal



Entidad Ejecutora: Alta Consejería para el Posconflicto.



Apoyar el funcionamiento de la Alta Consejería para el Posconflicto.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 Años





Planeación  
\$ 4

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Presidencia Posconflicto	\$ 4	DAPRE	Por definir

PRESIDENCIA POSCONFLICTO



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 991

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	<a href="#">616-2018</a>	\$991	Ene 2018 Nov 2018	50%
Gastos Bancarios	N/A	-	\$0,01	Dic 2017	100%

\$991

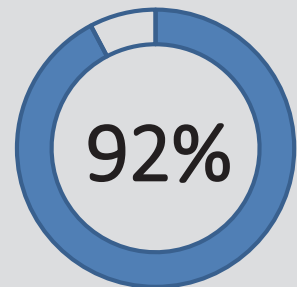

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$6.782

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	<a href="#">403-18</a>	\$ 3.000	jul-18	En proceso de liquidación
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	<a href="#">558-18</a>	\$ 2.790	jul-18	En proceso de liquidación
19 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 640	ago-18	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	<a href="#">532-18</a>	\$ 266	jul-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	<a href="#">565</a>	\$ 71	dic-17	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	<a href="#">559</a>	\$ 16	dic-17	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$0,00

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$5.000

Terminado  
\$0,00

# Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución  
\$ 5.000

Terminados

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sociedad de Activos Especiales	SAE	<a href="#">059</a>	\$5.000	Dic 2020	100%

\$5.000

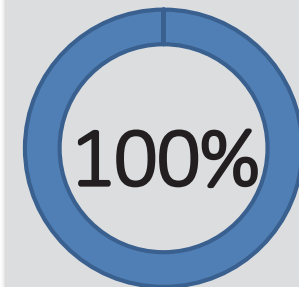

EJECUCIÓN





Planeación  
\$0,00

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$2.498

Terminado  
\$252

# Colombia Sostenible

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a desarrollar en asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 5 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 2.498

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda.	<a href="#">786</a>	\$505	May 2018 Dic 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consortio Desarrollo Rural 2018	<a href="#">784</a>	\$503	May 2018 Dic 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consortio Desarrollo Rural 2018	<a href="#">787</a>	\$503	May 2018 Dic 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	<a href="#">785</a>	\$497	May 2018 Nov 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Andina)	Consortio Escuela Galán - JPC	<a href="#">783</a>	\$ 490	May 2018 Dic 2018	45%

\$2.498

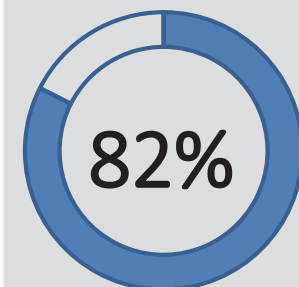

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 252

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 252	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$1.959

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$0,00

Terminado  
\$0,00

# Contrapartidas de Cooperación

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz



Apoyar el cierre de proyectos con recursos de cooperación que demanden un case por parte del Gobierno Nacional



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 1.959

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	FCP	Por definir

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN



Planeación  
\$0,00

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$0,00

Terminado  
\$0,00

# Procuraduría

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Procuraduría General de la Nación



Apoyar acciones en terreno para generar alertas en torno a la satisfacción de los derechos de las víctimas.



Focalización: Transversal



Estado: En proceso de creación



Temporalidad: 10 años





# Fondos de Cooperación



## Nota Técnica

- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
  - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
  - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
  - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
  - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.



## Fondos Posconflicto



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas  
para el Posconflicto

**USD 85.668.040**

Desembolsados al Fondo

**USD 0**

Comprometidos

**USD 85.668.040**

Total movilizado



**BANCO MUNDIAL**  
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial  
para la Paz y el  
Posconflicto

**USD 7.160.000**

Desembolsados al Fondo

**USD 0**

Comprometidos

**USD 7.160.000**

Total movilizado



Unión Europea  
para Colombia

**EUR 90.993.729**

Desembolsados al Fondo

**EUR 5.414.590**

Comprometidos

**EUR 96.408.319**

Total movilizado



BID Colombia  
Sostenible

**USD 18.575.437**

Desembolsados al Fondo

**USD 192.424.561**

Comprometidos

**USD 210.999.998**

Total movilizado

\*Corte a septiembre 2018



GOBIERNO DE COLOMBIA





## Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto



NACIONES UNIDAS

# 107

Proyectos aprobados  
por USD \$77.6M  
(2016, 2017 y 2018)

Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Alemania	USD 7.295.170	
Canadá	USD 15.229.371	
Fondo Consolidación de Paz, ONU	USD 15.000.000	
Global Acceleration Instrument	USD 2.000.000	
Irlanda	USD 887.586	
Reino Unido	USD 19.961.745	
Noruega	USD 9.634.950	
Suecia	USD 9.492.667	
Suiza	USD 3.090.580	
SDG Fund	USD 1.500.000	
Nueva Zelanda	USD 104.400	
Cooperación Catalana	USD 363.245	
Portugal	USD 72.120	
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000	
	<b>Total: USD 85.668.040</b>	





## Fondo para la Paz y el Posconflicto



5

Proyectos aprobados  
por un valor de USD  
\$5.840.250

Donante	Recursos Registrados
 Banco Mundial	USD 4.000.000
 Suecia	USD 3.100.000
<b>Total</b>	<b>USD 7.100.000</b>





## Fondo de la Unión Europea para Colombia



13

Proyectos en ejecución por un total de  
51,3 Millones de Euros

5

Proyectos aprobados y en proceso de contratación  
16,1 Millones de Euros

\* Cifra sin intereses  
Intereses bancarios 143 euros




Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Alemania	EUR 3.000.000	
Chipre	EUR 10.000	
Comisión Europea	EUR 71.400.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
España	EUR 2.010.000	EUR 990.000
Francia	EUR 1.800.000	EUR 1.200.000
Holanda	EUR 3.000.000	
Hungría	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 1.500.000	EUR 1.500.000
Italia	EUR 3.000.000	
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 24.000	
Luxemburgo	EUR 35.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
República Checa	EUR 20.319	
Suecia	EUR 1.392.410.	EUR 1.784.590
<b>Total:</b>	<b>EUR 90.993.729*</b>	<b>EUR 5.414.590</b>





## Fondo Colombia Sostenible



Donante	Recursos Registrados	Recursos comprometidos
 Declaración Conjunta (Noruega, Alemania y Reino Unido).	USD 14.250.000	\$ 185.750.000
 Suecia	USD 1.575.437	\$ 4.424.563
 Suiza	USD 2.750.000	\$ 2.250.000
Total:		
*Componente de pago por resultados	USD 18.575.437	\$ 192.424.563



## Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fiduprevisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.
