

INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

06 al 10 de agosto de 2018



Ejecución Presupuestal



Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.





Balance Fondo Colombia en Paz

% Recursos contratados/desembolsos

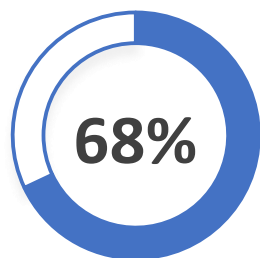

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
DESEMBOLSOS	\$ 1.159.070	\$ 1.150.270	\$ 1.500	\$ 7.300
CONTRATADO	\$ 786.599	\$ 777.799	\$ 1.500	\$ 7.300
PAGADO	\$ 586.813	\$ 585.313	\$ 1.500	\$ -

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

El gráfico presentan la relación de contratados y desembolsados.


(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.

(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol.





Recursos de PGN administrados por el FCP



Subcuentas	Asignados	Contratados	Pagados	En proceso de planeación y estructuración
Sustitución de Cultivos	\$ 680.699	\$ 445.741	\$ 378.993	\$ 234.959
ART- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial	\$ 200.754	\$ 155.771	\$ 54.013	\$ 44.983
Reincorporación	\$ 121.907	\$ 101.629	\$ 101.629	\$ 20.278
JEP	\$ 44.493	\$ 24.037	\$ 20.177	\$ 20.456
Proyectos Productivos - ADR	\$ 28.880	\$ 19.021	\$ 7.824	\$ 9.859
Primera Infancia	\$ 20.000	\$ 3.863	\$ 3.611	\$ 16.137
Agencia Nacional de Tierras	\$ 18.281	\$ 2.899	\$ 1.047	\$ 15.381
Funcionamiento	\$ 17.771	\$ 12.252	\$ 7.357	\$ 5.518
Presidencia Posconflicto	\$ 7.776	\$ 5.112	\$ 4.332	\$ 2.665
Sociedad de Activos Especiales	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 0
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.474	\$ 1.332	\$ 276
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$ 0	\$ 0	\$ 1.959
Procuraduría	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 1.150.270	\$ 777.799	\$ 585.313	\$ 372.471

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Relación entre los recursos pagados y los contratados.





Resultados recursos administrados por FCP

Firmados Pactos Municipales en Puerto Guzmán y San Miguel (Putumayo) después de concertar con las diferentes comunidades y tras una intensa etapa veredal, en la que participaron afros, indígenas y campesinos.

Socializado Proyecto Productivo aprobado por la Agencia de Desarrollo Rural, **sobre el repoblamiento bovino en la Mojana (Bolívar, Córdoba y Sucre)**, en el cual se invertirán 3 mil millones de pesos para beneficiar 159 pequeños y medianos ganaderos de la región.

Firmado el Convenio de intercambio de información entre la Agencia Nacional de Tierras y la Comisión de la Verdad. La ANT abre sus puertas sin límite ni restricción al esclarecimiento de la verdad sobre el rol de la tierra en el conflicto armado.



Procesos de contratación





Línea de tiempo – Procesos de Contratación



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

Incluye recursos PGN, aportes privados (\$1.500 millones de Fundapanaca) y otros recursos públicos (\$7.300 millones de Cenit)



Planeación

\$ 364.930

Convocatoria



Evaluación



Asignación



Ejecución



Terminados

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Programa Sustitución de Cultivos Ilícitos	\$ 232.887	Dirección de Sustitución de Cultivos	ago-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 20.147	ART	ago-18
Beneficios económicos: proyectos productivos	\$ 19.320	ARN	ago-18
Operador Logístico Municipal	\$ 18.328	ART	ago-18
Sistemas de Información JEP	\$ 16.919	JEP	ago-18
Compra de tierras	\$ 12.000	ANT	Por definir
Proyectos Productivos	\$ 9.859	Agencia de Desarrollo Rural	ago-18
Pilotaje de modalidad familiar: educación Inicial en la zona rural y rural dispersa – Santa Rosa Sur, San pablo y Cantagallo, Bolívar	\$ 4.091	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Colecciones especializadas de literatura y salas de lectura para primera infancia	\$ 3.780	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
1000 primeros días de vida	\$ 2.866	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Plan de medios acuerdo de paz	\$ 2.303	DAPRE	ago-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 2.257	ANT	jul-18
Auditoría externa	\$ 2.100	FCP	ago-18
Interventoría Café - Semilla	\$ 2.036	Dirección de Sustitución de Cultivos	ago-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 2.026	JEP	ago-18
Seguridad Alimentaria	\$ 1.959	FAO/COOPERACIÓN	Por definir



Planeación

\$ 364.930

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la Política de la Primera Infancia “de cero a siempre”	\$ 1.314	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cuerpo sonoro: expresiones artísticas y primera infancia	\$ 1.129	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	\$ 1.110	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Comisión Fiduciaria	\$ 1.035	FCP	ago-18
Renta Básica, asignaciones únicas de normalización, pensión y BEPS	\$ 958	ARN	ago-18
Apoyo a la supervisión y interventoría de la experiencia de implementación del PMI PI	\$ 833	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Viáticos y gastos de viaje	\$ 760	ANT	ago-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 636	FCP	ago-18
Operación logística	\$ 500	JEP	Por definir
Transparencia	\$ 450	FCP	ago-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 389	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Viáticos y gastos de viaje	\$ 356	FCP	ago-18
Adecuación y suministro del cableado estructurado	\$ 338	JEP	Por definir



Planeación

\$ 364.930

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Oportunidades de negocios proyectos productivos	\$ 300	DAPRE	ago-18
Programa de seguros	\$ 298	FCP	ago-18
Apoyo para la garantía registro civil de niños y niñas	\$ 295	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Portal web FCP	\$ 280	FCP	ago-18
Estructuración de Proyectos Productivos (Andina)	\$ 270	DAPRE	Por definir
Análisis comparativo recursos CONPES primera infancia	\$ 210	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Operación servicios TIC	\$ 177	FCP	ago-18
Documentación del PMI PI en territorios PDET	\$ 120	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Papelería	\$ 100	FCP	ago-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 62	DAPRE	ago-18
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	JEP	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 26	Dirección de Sustitución de Cultivos	ago-18
Adecuaciones menores	\$ 19	JEP	ago-18
Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 18	FCP	ago-18
Servicios de mantenimiento	\$ 15	FCP	ago-18
Por asignar Colombia Sostenible	\$ 6	DAPRE	Por definir
Total	\$ 364.930		

Nombre Corto	Valor	Observaciones
Crédito Colombia Sostenible	\$60.000	Crédito firmado. Reglamento operativo aprobado el 19 de junio.



Planeación

Convocatoria
\$ 427

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	Dirección de Sustitución de Cultivos / FCP / ANT	\$ 427	21 de agosto de 2018

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 5.817

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría PIC II	ART	\$ 5.210	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consorcio Interventorías para la Paz. 2. Consorcio Cipa-INARCONST. 3. GOC sucursal Colombia 	13 de agosto de 2018
Sistemas de información	JEP	\$ 607	<ol style="list-style-type: none"> 1. UT PwC AG. 2. UT SGSI – 2018. 3. Password Consulting Services S.A.S. 4. Assurance Control Tech S.A.S. 	05 de septiembre de 2018

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 1.297

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Departamento / Municipio	Valor	Observaciones	Fecha estimada inicio de contrato*
Estrategia y pauta	ART	Rafael Poveda Televisión S.A.S.	Bogotá	\$ 1.297	Pendiente suscripción de acta de inicio	13 de agosto de 2018

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Ejecución de contratos



Nota Técnica

- La relación porcentual presentada en los gráficos corresponde a la relación entre los recursos pagados y el valor total de los contratos en ejecución de forma agregada en cada una de las subcuentas.
- Este porcentaje puede bajar como consecuencia de la entrada de un nuevo contrato en ejecución, lo cual inmediatamente incrementa el valor total de los recursos contratados en la subcuenta, pero no así los giros correspondientes a pagos que obedece a la ejecución financiera del contrato.
- El valor total de los contratos en ejecución para cada una de las subcuentas disminuye tras la terminación de los contratos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$ 743.599

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$248.016	Nov 2017 Dic 2018	100%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	56%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	AF 001	\$60.000	Sep 2017 Oct 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nalional de Cafeteros	760-18	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	10%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	771-18	\$880	Ene 2018 Oct 2018	58%
Viáticos y gastos de viaje	N/A	N/A	\$31	N/A	68%

\$445.561*

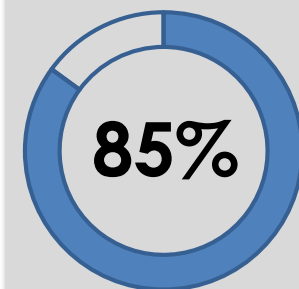

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

* Disminuye el valor en ejecución por 2 contratos que pasan a etapa de terminados





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 743.599

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$14.959		30%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$14.772		30%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	\$10.993		30%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	\$7.319		30%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	\$9.295		30%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$5.641		30%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588		30%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$3.762		30%
	Corporación Prohaciendo	542-18	\$1.868		30%
	Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.244		0%
Operador Logístico PDET	Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$51.448**	Nov 2017 Oct 2018	28%
Mejoramiento Vial	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	Convenio Marco 001-17	\$7.300***	Jul 2018 Dic 2019	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	2 (2018)	N/A	\$158*	Ene 2018 Ago 2018	70%

\$150.814*

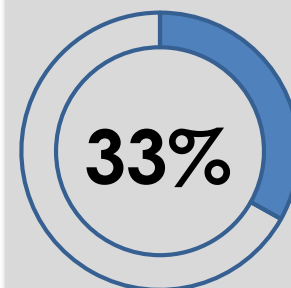

EJECUCIÓN

* Disminuye el valor en ejecución por 438 contratos que pasan a etapa de terminados

** Adición al Contrato por \$4.927 millones

***Otros recursos Públicos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 743.599

Terminados


PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Implementación del proceso de cualificación "Mandalavida" en los municipios priorizados	Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.089	Mar 2018 Ago 2018	80%
Prestación de Servicios Persona Natural	1 (2018)*	N/A	\$72	Ene 2018 Sep 2018	52%

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones

* Disminuye el valor en ejecución por 20 contratos (19 OPS) que pasan a etapa de terminados

\$1.161*

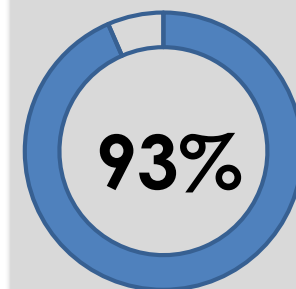

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$ 743.599

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Alquiler de Vehículos	Union Temporal Convencionales Blindados 2018	788-18	\$1.372	Mar 2018 Sep 2018	57%
Arquitectura de tecnologías de la información y analítica	Universidad de los Andes	402-18	\$597	Ene 2018 Ago 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	Unión Temporal L&K	793-18	\$575	May 2018 Nov 2018	31%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791	\$323	Abr 2018 Dic 2018	24%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$250	May 2018 May 2019	0%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$100	Mar 2018 Sep 2018	0%
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	Copy Solutions LTDA	795-18	\$48	May 2018 Oct 2018	0%
ARL	N/A	N/A	\$55	Jun 2018 Oct 2018	100%
Adecuaciones menores	N/A	N/A	\$6	Jun 2018 Dic 2018	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	135*	N/A	\$6.455*	Ene 2018 Oct 2018	75%

\$9.780*

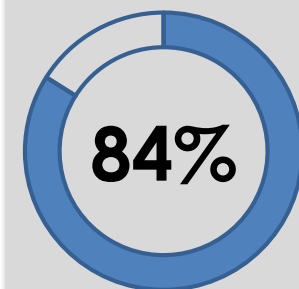

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

* Disminuye el valor en ejecución por 5 contratos

(4 OPS) que pasan a etapa de terminados



GOBIERNO DE COLOMBIA



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 743.599

Terminados

PRESIDENCIA – POSCONFLICTO

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	616-2018	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	5*	N/A	\$86	Ene 2018 Ago 2018	0%

\$1.077*

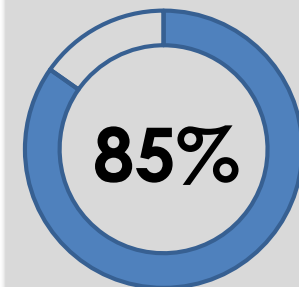

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

* Disminuye el valor en ejecución por 3 contratos (1 OPS) que pasan a etapa de terminados





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 743.599

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda.	786	\$505	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consortio Desarrollo Rural 2018	784	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consortio Desarrollo Rural 2018	787	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	785	\$497	May 2018 Nov 2018	45%
Prestación de Servicios Persona Natural	1	N/A	\$162	Ene 2018 Sep 2018	77%

\$2.169*

54%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

* Disminuye el valor en ejecución por 1 contrato que pasan a etapa de terminados





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 743.599

Terminados

Subcuenta	Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
ARN	Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas – Reincorporación pensión y BEPS	Banco Agrario	BAC 001	\$96.608	Abr 2018 Dic 2018	100%
	Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	\$680	Jun 2018 Dic 2018	100%
SAE	Sociedad de Activos Especiales	SAE	059	\$5.000	Dic 2020	100%
ANT	Prestación de Servicios Persona Natural - ANT	87*	-	\$2.843	Ene 2018 Oct 2018	35%
	TOTAL			\$105.132		

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

* Disminuye el valor en ejecución por 2 contratos que pasan a etapa de terminados





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 743.599

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	27%
Tecnologías de la información	Itelcom	765-18	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	34%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	397-18	\$778	Ene 2018 Dic 2018	65%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	781-18	\$60	Mar 2018 Dic 2018	29%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$56	Ene 2018 Dic 2018	37%
Gastos varios	N/A	N/A	\$14	Ene 2018 Dic 2018	72%
Viáticos	N/A	N/A	\$17	Ene 2018 Dic 2018	100%
Equipo Unidad Técnica	12	N/A	\$2.735	Ene 2018 Dic 2018	69%

\$8.883

60%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 743.599

Terminados

PROYECTOS PRODUCTIVOS - ADR

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	561-18	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	792-18	\$463	Jun 2018 Ene 2019	0%

\$19.021

41%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 43.000

CONTRATOS TERMINADOS

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor *	Terminación
PDET	721 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 12.257	jul-18
JEP	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	572-17	\$ 11.740	jun-18
Reincorporación	Fundapanaca	550	\$ 5.000	mar-18
Presidencia Posconflicto	Propaís	403-18	\$ 2.700	jul-18
JEP	66 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 2.084	jul-18
Primera Infancia	Save the Children	540-18	\$ 1.971	jul-18
Funcionamiento	Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18
Reincorporación	ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-2018	\$ 840	jun-18
Primera Infancia	28 Prestaciones de servicios Persona Natural	-	\$ 731	jul-18
Funcionamiento	22 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 615	jun-18
Presidencia Posconflicto	15 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 510	jul-18
Presidencia Posconflicto	J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 486	jul-18
Funcionamiento	Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334	\$ 400	dic-17
JEP	SICMES SAS	794-18	\$ 276	jul-18
Presidencia Posconflicto	Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 251	jul-18
Colombia Sostenible	Consortio Escuela Galán - JPC	783	\$ 221	jul-18
Funcionamiento	Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4	\$ 212	ene-18

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones /*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 43.000

CONTRATOS TERMINADOS

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor *	Terminación
Sustitución	3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 179	jul-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados	33-18	\$ 163	may-18
JEP	Aon	NA	\$ 156	jun-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados S.A.	3	\$ 117	dic-17
Funcionamiento	Syneris	541-18	\$ 96	abr-18
Colombia Sostenible	3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 84	jun-18
Funcionamiento	Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18
Presidencia Posconflicto	Dattis Comunicaciones S.A.S.	565	\$ 71	dic-17
ANT	3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 56	jul-18
Funcionamiento	Armtrans Ltda.	121	\$ 41	dic-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	122	\$ 35	nov-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	335	\$ 33	nov-17
Funcionamiento	Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125	\$ 21	dic-17
Presidencia Posconflicto	Salamarquez S.A.S.	559	\$ 16	dic-17
Funcionamiento	Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18
Funcionamiento	ABM Comercializadora S.A.S.	126	\$ 6	dic-17
Total			\$ 43.000	

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones /*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Fondos de Cooperación




Nota Técnica

- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.




Balance por Fondos de Cooperación


% Recursos contratados/desembolsos




Fondo
Colombia
Sostenible



Fondo
Multidonante
(ONU)



Fondo de la
Unión
Europea



Fondo del
Banco
Mundial

COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 96,4

US \$7,1

DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 84,6

EUR\$ 89,6

US \$7,1

CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 72,8

EUR\$ 51,8

US \$5,8

PAGADO

USD\$ 0

US\$ 61,1

EUR\$ 17,7

US \$2,5

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.





Resultados Fondos de Cooperación

Fondo Multidonante ONU

Publicado por el Instituto Kroc, 2do. Informe sobre el **Estado Efectivo de Implementación del Acuerdo De Paz en Colombia (dic-2016 a may-2018)**.

Disponible en http://kroc.nd.edu/assets/284864/informe_2_instituto_kroc_final_with_logos.pdf

Terminadas 200 obras de pequeña infraestructura (PIC) en 17 departamentos y 44 municipios priorizados para el desarrollo de PICs, en desarrollo del **proyecto de Manos a la Obra para la Paz**.

Despejados 439 m2 de sospecha de minas antipersonal en las áreas peligrosas la Trocha y la Morra en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).

Llevado a cabo el **Primer Encuentro de la Escuela Psicosocial para Lideresas Sociales** en las ciudades de Cúcuta y Tibú (Norte de Santander) con la participación de 15 mujeres en el marco del proyecto de Prevención de Violencia Basada en Género (VBG).





Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fiduprevisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.
