



INFORME SEMANAL FONDO COLOMBIA EN PAZ

24 al 28 de diciembre de 2018



Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta y/o los traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestales.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea o componente del Plan Operativo Anual por subcuenta.



Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html> y <http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



Subcuentas Administradas

- | | | |
|--|---|--|
|  Reincorporación |  Jurisdicción Especial de Paz |  Presidencia Posconflicto |
|  Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial |  Agencia Nacional de Tierras |  Funcionamiento |
|  Primera infancia |  Colombia Sostenible BID |  Procuraduría |
|  Sustitución de Cultivos |  Sociedad de Activos Especiales |  Contrapartidas de Cooperación |



Resultados

Más de **400 niños, niñas, jóvenes y adolescentes** que participan de escuelas de formación deportiva en el municipio de Algeciras (Huila), son beneficiados con acciones comunitarias que promueven su fortalecimiento y fomentan la reconciliación entre personas en proceso de reincorporación y la comunidad.

Como resultado del Modelo de Reintegración Comunitaria en Barrancabermeja, se creó la asociación **+Arte +Paz**, compuesta por artesanos expertos, aficionados, excombatientes y víctimas del conflicto, buscando fortalecer el turismo, el arte y la reconciliación.

El Modelo de Reintegración Comunitaria llegó a **26 departamentos** para fomentar la convivencia entre excombatientes y habitantes de comunidades que los acogen y seguirá propiciando espacios para la reconciliación en Colombia.



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos (2)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 1.667.745*	\$ 1.658.029	\$ 1.500	\$ 8.186
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 1.003.722	\$ 1.002.222	\$ 1.500	\$ -
TOTAL PAGADO	\$ 868.978	\$ 867.478	\$ 1.500	\$ -

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – Convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.


(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol, Rendimientos apropiados

* Aumenta la asignación presupuestal de acuerdo con la Resolución 5016 del 19 de diciembre de 2018





Ejecución y Disponibilidad Presupuestal




Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.168.650	\$ 586.258	50%	\$ 582.392	50%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 208.054	\$ 182.270	88%	\$ 25.784	12%
Reincorporación	\$ 171.229	\$ 151.687	89%	\$ 19.542	11%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.493	\$ 26.492	60%	\$ 18.001	40%
Primera Infancia	\$ 20.552	\$ 18.541	90%	\$ 2.010	10%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 18.281	\$ 4.618	25%	\$ 13.662	75%
Funcionamiento	\$ 18.487	\$ 17.877	97%	\$ 609	3%
Presidencia Posconflicto	\$ 8.291	\$ 8.228	99%	\$ 63	1%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 5.000	\$ 5.000	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.750	100%	\$ 0	0%
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$ 0	0%	\$ 1.959	100%
Procuraduría	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 1.667.745	\$ 1.003.722	60%	\$ 664.023	40%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.



Ejecución Financiera




Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 586.258	\$ 556.212	95%	\$ 30.046	5%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 182.270	\$ 103.093	57%	\$ 79.178	43%
Reincorporación	\$ 151.687	\$ 151.596	100%	\$ 91	0%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 26.492	\$ 24.546	93%	\$ 1.945	7%
Primera Infancia	\$ 18.541	\$ 4.943	27%	\$ 13.598	73%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 4.618	\$ 2.615	57%	\$ 2.003	43%
Funcionamiento	\$ 17.877	\$ 11.313	63%	\$ 6.564	37%
Presidencia Posconflicto	\$ 8.228	\$ 7.172	87%	\$ 1.057	13%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 5.000	\$ 5.000	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.488	90%	\$ 262	10%
Contrapartidas de Cooperación	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Procuraduría	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 1.003.722	\$ 868.978	87%	\$ 134.744	13%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos pagados y recursos comprometidos.



Línea del Tiempo

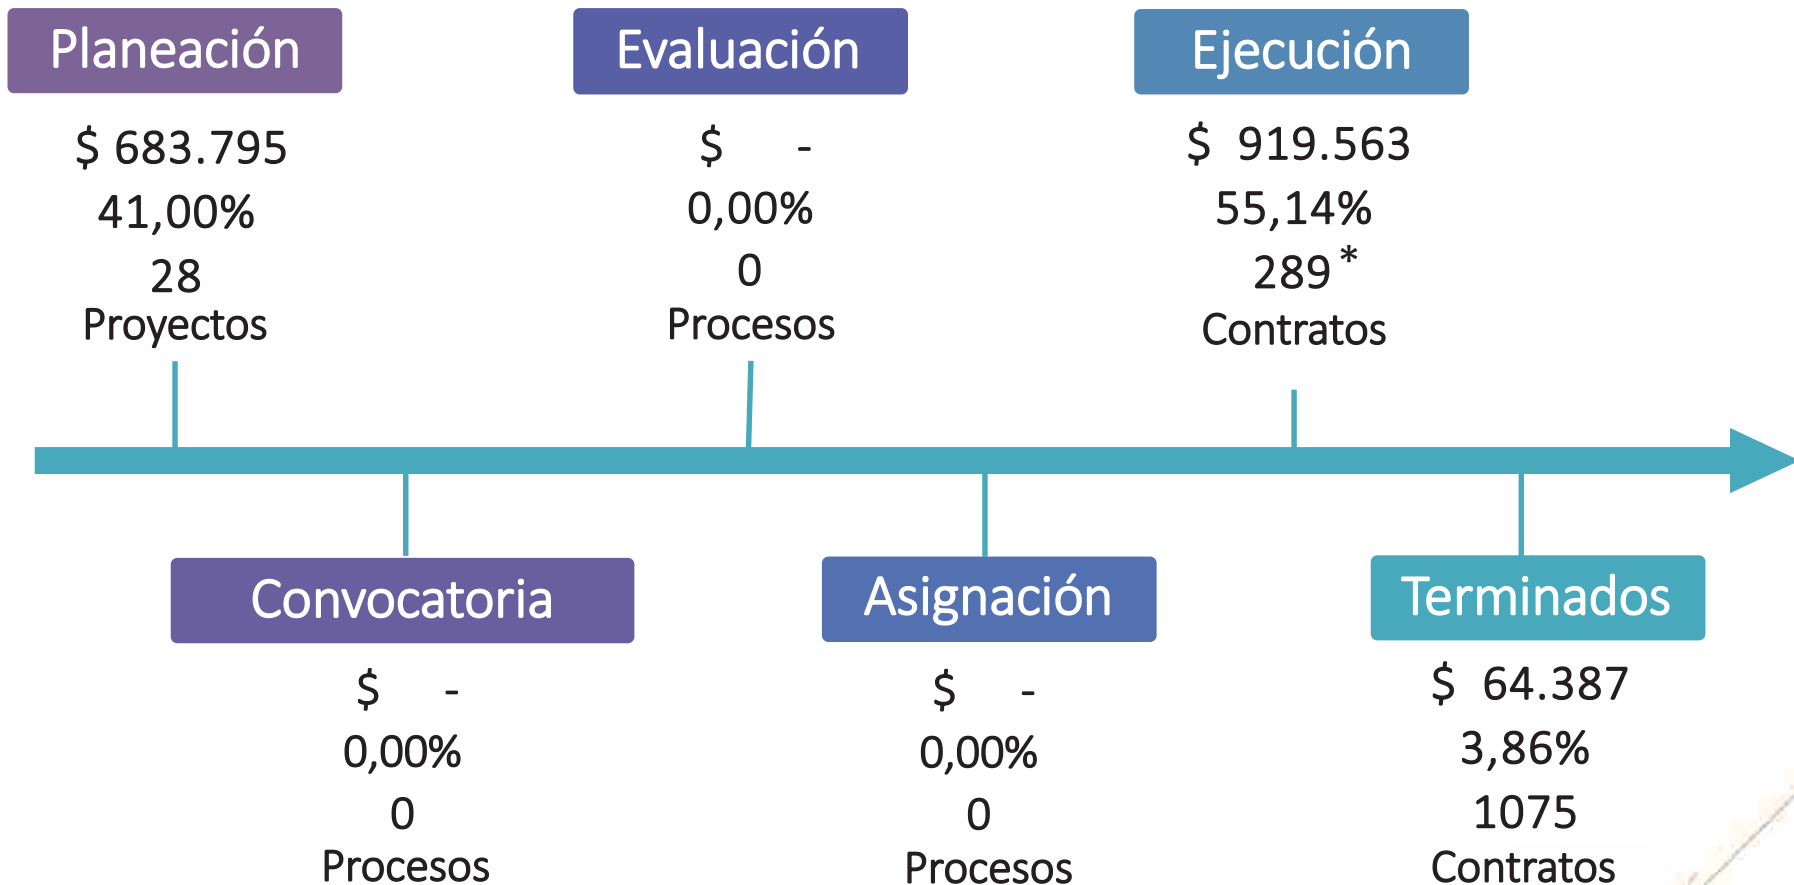

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se suscribieron 19 contratos adicionales para las subcuentas PDET, Presidencia Posconflicto, Primera Infancia y Sustitución de Cultivos Ilícitos



Planeación
\$ 582.746

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 585.715

Terminado
\$ 189

Sustitución de Cultivos

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de Presidencia



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 582.746

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar	\$ 589.392	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Interventoría Fedecacao	\$ 320	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 25	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Tiquetes Aéreos	\$ 9	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 585.715

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$360.387	Nov 2017 Dic 2018	100%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	100%
Sustitución voluntaria y concentrada de cultivos	UNODC	AF 001	\$67.500	Sep 2017 Jul 2019	89%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$14.280	Ene 2018 Ene 2020	10%
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	561-18	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	70%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$9.791	Nov 2017 Oct 2019	46%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	771-18	\$880	Ene 2018 Oct 2019	88%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	792-18	\$463	Jun 2018 Feb 2019	63%
Prestación de Servicios Persona Natural	4 (2018)	N/A	\$210	Ago 2018 Jun 2019	55%
Viáticos y gastos de viaje	N/A	N/A	\$24	N/A	87%

\$585.715*

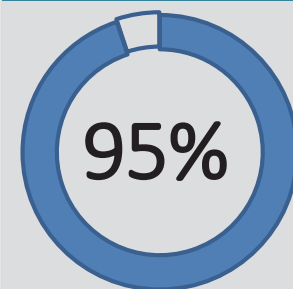

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 189

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$189	jul-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ 39.387

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 152.894

Terminado

\$ 15.773

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 39.387

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ART	\$ 25.784	ART	Por definir
Interventoría PIC II	\$ 8.799	ART	Por definir
Adición Contrato Carvajal	\$ 4.701	ART	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 103	ART	Por definir



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 152.894

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador Logístico	Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$51.448	Nov17 - Feb 19	86%
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	\$16.467	Feb18 - Jul19	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$14.959	Feb18 - Feb19	60%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$14.772	Feb18 - Ene19	60%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	\$13.238	Feb18 -May19	50%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	\$9.295	Feb18 - Feb19	60%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	\$8.769	Feb18 - May19	25%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$5.641	Feb18 - Ene19	30%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$5.612	Feb18 - May19	40%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588	Feb18 - Feb19	30%
	Corporación Prohaciendo	542-18	\$1.868	Feb18 - Ene19	60%
Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.848	Feb18 – May19	20%	
Prestación de Servicios	177 OPS	N/A	\$2.269	Oct18 - Jun19	39%
Plan de Comunicaciones	Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$990	Ago18 - Jul19	0%
Viáticos	Viáticos	N/A	\$120	Nov18 – Dic18	16%
Gastos Varios	Gastos Varios	N/A	\$10	Nov17 - Dic18	100%

\$152.894*

58%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución aumenta debido a la suscripción de 5 Contratos de Prestación de Servicios



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 15.773

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
723 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$15.773	ago-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ 19.542

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 145.637

Terminado

\$ 6.050

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 19.542

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ARN	\$ 19.542	ARN	Por definir

REINCORPORACIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 145.637

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$129.186	Abr 2018 Dic 2018	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$13.668	Abr 2018 Dic 2018	100%
Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	\$2.784	Jun 2018 Dic 2018	100%

\$145.637

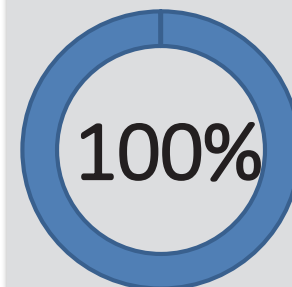

EJECUCIÓN

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 6.050

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fundapanaca	550-17	\$5.000	mar-18	En proceso de liquidación
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$1.050	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ 18.001

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 3.143

Terminado

\$ 23.348

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





Planeación
\$ 18.001

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar JEP	\$ 18.001	JEP	Por definir

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 3.143

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Vigilancia y seguridad privada	U.T. L&K	793-18	\$798	May 2018 Dic 2018	84%
Prestación de Servicios Persona Natural	14	N/A	\$586	Ago 2018 Ago 2019	30%
Sistemas de información	Password Consulting Services S.A.S.	897-18	\$584	Ene 2019 May 2019	0%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$485	Abr 2018 Mar 2019	80%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$250	May 2018 May 2019	40%
Servicio de Impresión	Solution Copy Ltda.	1082-18	\$200	Nov 2018 Mar 2019	32%
Viáticos	N/A	N/A	\$80	Oct 2018 Dic 2018	65%
ARL	N/A	N/A	\$82	Jun 2018 Dic 2018	90%
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	Solution Copy Ltda.	795-18	\$72	May 2018 Dic 2018	100%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$6	Jun 2018 Dic 2018	100%

\$3.143

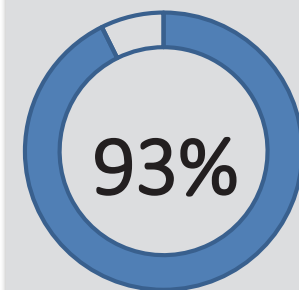

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 23.348

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
163 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$7.528	sep-18	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$1.372	ago-18	En proceso de liquidación
42 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$1.241	nov-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Universidad de los Andes	402-18	\$597	Nov-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$100	sep-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ 15.079

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 290

Terminado

\$ 5.182

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Consejería Presidencial para la Primera Infancia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 15.079

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa. Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo - Bolívar	\$ 4.037	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	\$ 3.741	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Implementación oferta complementaria "Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida", en municipios PDET	\$ 2.757	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Por asignar Primera Infancia	\$ 2.010	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación "Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia" en 28 municipios PDET	\$ 1.113	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación de las estrategias "Cuidarte" y "Hábitos de vida saludable: MEMO"	\$ 1.048	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 373	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir

PRIMERA INFANCIA



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 290

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	4	N/A	\$290	Ene 2019 Dic 2019	0%

\$ 290

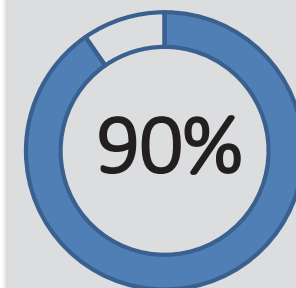

EJECUCIÓN

PRIMERA INFANCIA





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 5.182

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	540-18	\$3.198	jul-18	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.089	ago-18	En proceso de liquidación
11 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$312	sep-18	En proceso de liquidación
18 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$583	oct-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ 14.848

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 1.568

Terminado

\$ 1.865

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 14.848

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ANT	\$ 13.662	ANT	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 821	ANT	Por definir
Tiquetes Aéreos	\$ 364	ANT	Por definir



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.568

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	46	-	\$1.019	Ene 2018 Dic 2018	77%
Gastos de Viajes	N/A	N/A	\$549	Jun 2018 Dic 2018	1%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$0,17	Nov 2017 Mar 2018	100%

\$1.568

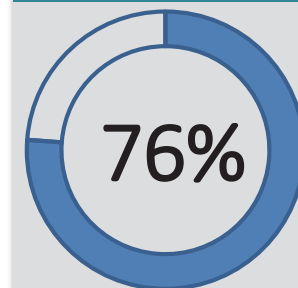

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 1.865

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
42 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$1.862	oct-18	En proceso de liquidación
1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$3	jul-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$ 969

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 14.052

Terminado
\$ 3.466

Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 969

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Funcionamiento	\$ 609	FCP	Por definir
Arrendamiento Dir. Ejecutiva	\$ 282	FCP	Por definir
Gestión Documental	\$ 42	FCP	Por definir
Papelería	\$ 30	FCP	Por definir
Suministro de Comunicaciones	\$ 6	FCP	Por definir

FUNCIONAMIENTO



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 14.052

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Equipo Unidad Técnica	7	N/A	\$5.195	Ene 2018 Dic 2018	45%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001	\$4.164	Abr 2018 Mar 2019	58%
Auditoría	Ernst & Young	N/A	\$ 2.100	Jun 2018 Mar 2019	44%
Tecnologías de la información	U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	\$1.599	Ene 2018 Ene 2019	81%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	397-18	\$778	Ene 2018 Dic 2018	100%
Viáticos	N/A	N/A	\$70	Ene 2018 Dic 2018	31%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	781-18	\$60	Mar 2018 Ene 2019	59%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$39	Ene 2018 Dic 2018	100%
Gastos Reembolsables	N/A	N/A	\$18	Mar 2018 Dic 2018	0%
Gastos varios	N/A	N/A	\$17	Ene 2018 Dic 2018	64%
Pago de Nómina	PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$7	Ago 2018 Mar 2019	61%
Gastos Admin. y de Operación	N/A	N/A	\$5	Dic 2018	100%

\$14.052*

65%

EJECUCIÓN

FUNCIONAMIENTO



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 3.466

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
20 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 622	jun-18	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4	\$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122	\$ 69	nov-17	En proceso de liquidación
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 54	nov-18	Liquidado
Armtrans Ltda.	121	\$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335	\$ 33	nov-17	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125	\$ 21	dic-17	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126	\$ 6	dic-17	En proceso de liquidación

FUNCIONAMIENTO



Planeación

\$ 63

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 464

Terminado

\$ 7.764

Presidencia Posconflicto

Transversal



Entidad Ejecutora: Alta Consejería para el Posconflicto.



Apoyar el funcionamiento de la Alta Consejería para el Posconflicto.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 Años





Planeación
\$ 63

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Presidencia Posconflicto	\$ 63	DAPRE	Por definir

PRESIDENCIA POSCONFLICTO



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 464

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	7	N/A	\$464	Dic 2018 Dic 2019	0%

\$ 464

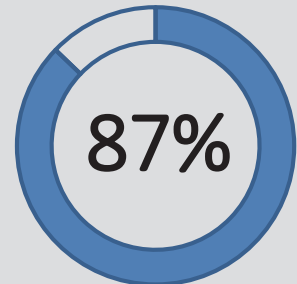

EJECUCIÓN

PRESIDENCIA POSCONFLICTO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 7.764

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	\$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.790	jul-18	En proceso de liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-2018	\$ 991	nov-18	En proceso de liquidación
19 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 640	ago-18	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 266	jul-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565	\$ 71	dic-17	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559	\$ 16	dic-17	En proceso de liquidación
Gastos Bancarios	N/A	\$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 5.000

Terminado

\$ -

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 5.000

Terminados

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sociedad de Activos Especiales	SAE	059	\$5.000	Dic 2020	100%

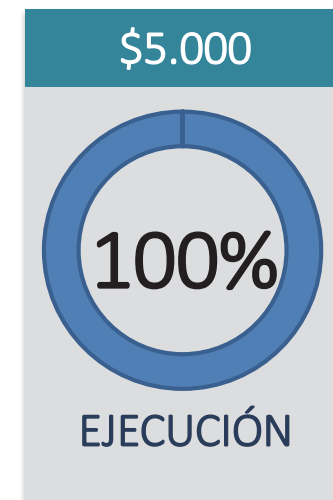



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 2.001

Terminado

\$ 749

Colombia Sostenible

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a desarrollar en asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 5 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 2.001

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda.	786	\$505	May 2018 Dic 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consorcio Desarrollo Rural 2018	784	\$503	May 2018 Dic 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consorcio Desarrollo Rural 2018	787	\$503	May 2018 Dic 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Andina)	Consorcio Escuela Galán - JPC	783	\$ 490	May 2018 Dic 2018	90%

\$2.001

90%

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 749

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
OPTIM Consult SAS	<u>785</u>	\$497	nov-18	En proceso de liquidación
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 252	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$ 1.959

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

Contrapartidas de Cooperación

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz



Apoyar el cierre de proyectos con recursos de cooperación que demanden un case por parte del Gobierno Nacional



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 1.959

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	FCP	Por definir

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN



Planeación
\$0,00

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$0,00

Terminado
\$0,00

Procuraduría

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Procuraduría General de la Nación



Apoyar acciones en terreno para generar alertas en torno a la satisfacción de los derechos de las víctimas.



Focalización: Transversal



Estado: En proceso de creación



Temporalidad: 10 años





Fondos de Cooperación



Nota Técnica

- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.



Fondos Posconflicto



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas
para el Posconflicto

USD 85.668.040

Desembolsados al Fondo

USD 0

Comprometidos

USD 85.668.040

Total movilizado



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial
para la Paz y el
Posconflicto

USD 7.160.000

Desembolsados al Fondo

USD 0

Comprometidos

USD 7.160.000

Total movilizado



Unión Europea
para Colombia

EUR 90.993.729

Desembolsados al Fondo

EUR 5.414.590

Comprometidos

EUR 96.408.319

Total movilizado



BID Colombia
Sostenible

USD 18.575.437

Desembolsados al Fondo

USD 192.424.561

Comprometidos

USD 210.999.998

Total movilizado

*Corte a diciembre 2018



GOBIERNO DE COLOMBIA





Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

107

Proyectos aprobados
por USD \$77.6M
(2016, 2017 y 2018)

Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Alemania	USD 7.295.170	
Canadá	USD 15.229.371	
Fondo Consolidación de Paz, ONU	USD 15.000.000	
Global Acceleration Instrument	USD 2.000.000	
Irlanda	USD 887.586	
Reino Unido	USD 19.961.745	
Noruega	USD 9.634.950	
Suecia	USD 9.492.667	
Suiza	USD 3.090.580	
SDG Fund	USD 1.500.000	
Nueva Zelanda	USD 104.400	
Cooperación Catalana	USD 363.245	
Portugal	USD 72.120	
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000	
	Total:USD 85.668.040	



Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.



NACIONES UNIDAS

Se están
construyendo
los Términos de
Referencia.

Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Reino Unido	\$ 5.092.400	
Chile	\$ 100.000	
Alemania		\$ 11.376.564
Irlanda	\$ 284.091	
Noruega		\$9.243.648
Total:	\$ 5.192.400	\$ 20.904.303





Fondo para la Paz y el Posconflicto



5

Proyectos aprobados
por un valor de USD
\$6.580.250

Donante	Recursos Registrados
 Banco Mundial	USD 4.000.000
 Suecia	USD 3.100.000
Total	USD 7.100.000



Fondo de la Unión Europea para Colombia



13

Proyectos en ejecución
por un total de
51,3 Millones de Euros

5

Proyectos aprobados y
en proceso de
contratación
16,1 Millones de Euros




Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Alemania	EUR 3.000.000	
Chipre	EUR 10.000	
Comision Europea	EUR 71.400.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
España	EUR 2.010.000	EUR 990.000
Francia	EUR 1.800.000	EUR 1.200.000
Holanda	EUR 3.000.000	
Hungría	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 1.500.000	EUR 1.500.000
Italia	EUR 3.000.000	
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 24.000	
Luxemburgo	EUR 35.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
República Checa	EUR 20.319	
Suecia	EUR 1.392.410	EUR 1.784.590
Total:	EUR 90.993.729*	EUR 5.414.590

- *Cifra sin intereses*
Intereses bancarios 143 euros



Fondo Colombia Sostenible



Donante	Recursos Registrados	Recursos comprometidos
 Declaración Conjunta (Noruega, Alemania y Reino Unido)*	USD 14.250.000	\$ 185.750.000
 Suecia	USD 1.575.437	\$ 4.424.563
 Suiza	USD 2.750.000	\$ 2.250.000
Total:		
*Componente de pago por resultados	USD 18.575.437	\$ 192.424.563
